


C 作業処理中

G 処理作業後

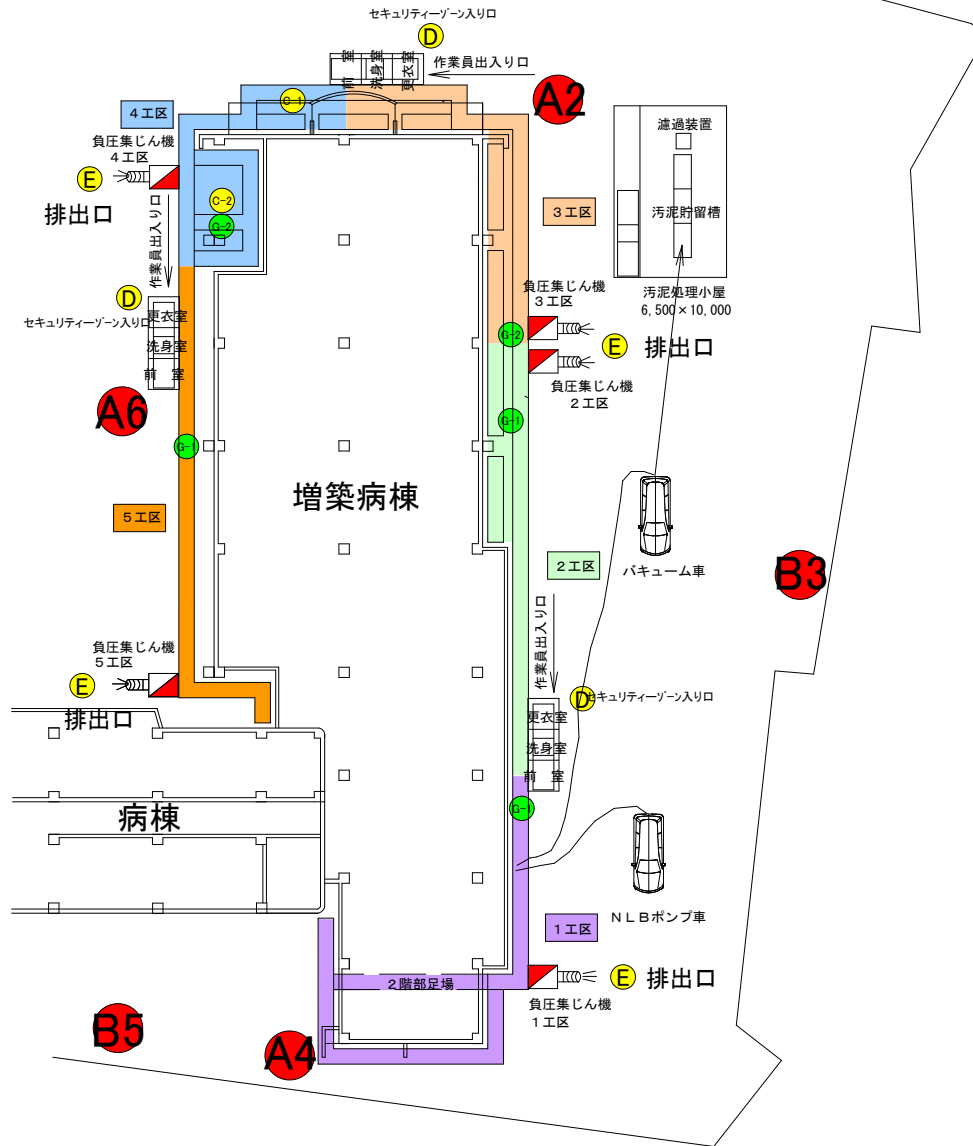

測定時間	重要度	測定場所	測定点数 (処理作業室毎)	備考
測定作業前	△	処理作業室内	2点又は3点	A
	△	施工区画周辺又は敷地境界	2点	B
作業処理中	△	処理作業室内	2点	C
	◎	セキュリティゾーン入り口	1点	D
	◎	集塵・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	1点	E
	○	施工区画周辺又は敷地境界	4方向各1点	F
処理作業後 (隔離シート撤去前)	◎	処理作業室内	2点	G
	△	施工区画周辺又は敷地境界	4方向各1点	H

石綿粉じん濃度測定結果速報

株式会社テクノ中央 様

作業環境測定機関登録 青森県労働局登録02-4  
 計量証明事業登録 青森県第36号  
**環境保全株式会社**  
 代表取締役 竹内 司  
 〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10  
 TEL 0172-43-1100 90 FAX 0172-43-1166  
 分析責任者 高橋 知行

業務名称	旧平川診療所解体撤去工事
試料採取場所	旧平川診療所 *****

試料採取日	作業時期	測定場所	石綿粉じん濃度 (総繊維数濃度) 【本/L】
平成29年8月17日	処理作業前	増築棟 A②	< 0.5
平成29年8月17日	処理作業前	増築棟 A④	< 0.5
平成29年8月17日	処理作業前	増築棟 A⑥	< 0.5
平成29年8月25日	処理作業前	敷地境界 B③	< 0.3
平成29年8月25日	処理作業前	敷地境界 B⑤	< 0.3
以下余白			

備考	
参考値	敷地境界基準 : 10本/L (大気汚染防止法施行規則第16条の2) 作業環境管理濃度 : 150本/L (作業環境評価基準第2条別表)
