2階平面図

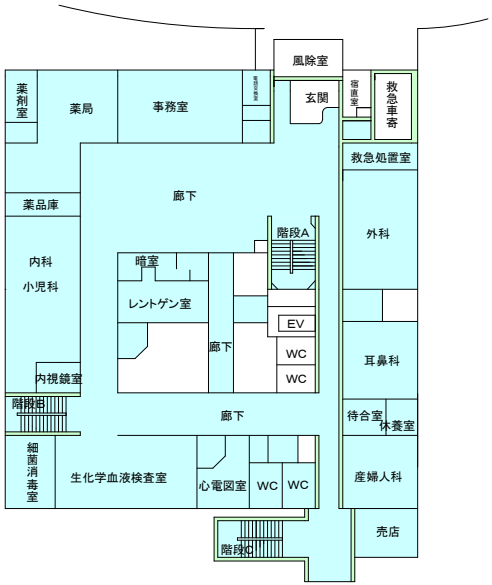

3階平面図

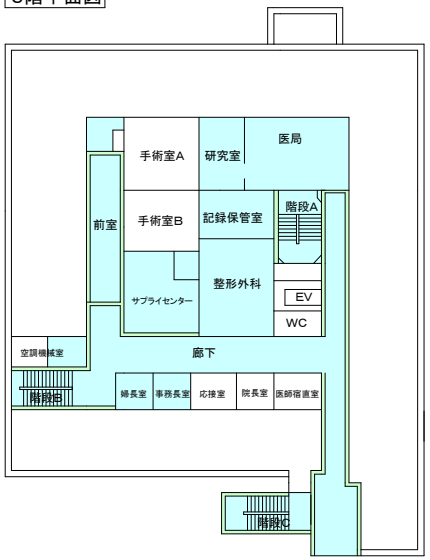

1階平面図

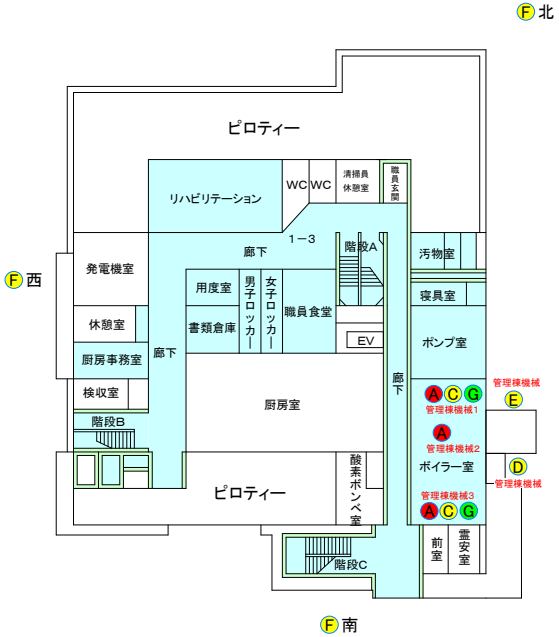

PH階平面図

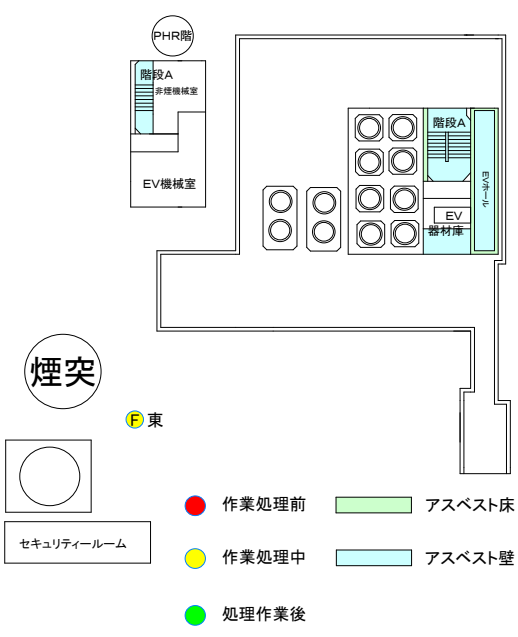

測定時間	重要度	測定場所	測定点数（処理作業室毎）	備考
測定作業前	△	処理作業室内	2点又は3点	A
作業処理中	△	処理作業室内	2点	C
	◎	セキュリティーゾーン入り口	1点	D
	◎	集塵・排気装置の排出口（処理作業室外の場合）	1点	E
	○	施工区画周辺又は敷地境界	4方向各1点	F
処理作業後（隔離シート撤去前）	◎	処理作業室内	2点	G

石綿粉じん濃度測定結果速報

株式会社テクノ中央　　様

作業環境測定機関登録 青森県労働局登録02-4
計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
代表取締役　竹内　司
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100 (代)　FAX　0172-43-1166
分析責任者　高橋　知行

業務名称	平㉙第2号　旧平川診療所解体撤去工事
採取場所	旧平川診療所
種別及び工区	管理棟機械室（保温材）

試料採取日	作業時期	測定場所	石綿粉じん濃度（総繊維数濃度）【本/L】
平成29年11月14日	処理作業後	処理作業室内　G 1	＜0.5
平成29年11月14日	処理作業後	処理作業室内　G 3	＜0.5
以下余白			

備考	
参考値	敷地境界基準　：　10本/L（大気汚染防止法施行規則第16条の2）
	作業環境管理濃度　：　150本/L（作業環境評価基準第2条別表）
